

工程名稱


預定施工日期

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. 室內游泳池整修工程 | 1100815/1101130 |
| 2. 百階教室整修工程 | 1101001/1101231 |
| 3. 體育館座椅汰換及階梯整修工程 | 1100112/1101231 |
| 4. 國際戶外探索體育園區建置工程 | 1100901/1101231 |
| 5. 綜合科技大樓外牆及公共空間整修工程 | 1100119/1100730 |
| 6. 原住民表演舞台(國際會議廳)整修工程 | 1101215/1110315 |
| 7. 羽球館天花板整修工程 | 1100112/1100330 |
| 8. 智慧電網設置工程 | 1100815/1101231 |

工程名稱

預定施工日期

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 9. 球類館與技擊館拆除及環境整理工程 | 1100718/1101204 |
| 10. 田徑場跑道整修工程 | 1100915/1110215 |
| 11. 戶外籃球場整建工程 | 1101001/1110331 |
| 12. 一期宿舍牆面防水及門窗改善工程 | 1101001/1110331 |
| 13. 單身職務宿舍整修工程 | 1100607/1100831 |
| 14. 體育館機房上方屋頂及環形露臺防水工程 | 1100419/1100728 |
| 15. 天然草皮足球場(田徑場)燈光照明改善工程 | 1101001/1110331 |
| 16. 戶外網球場燈光照明改善工程 | 1100901/1110331 |

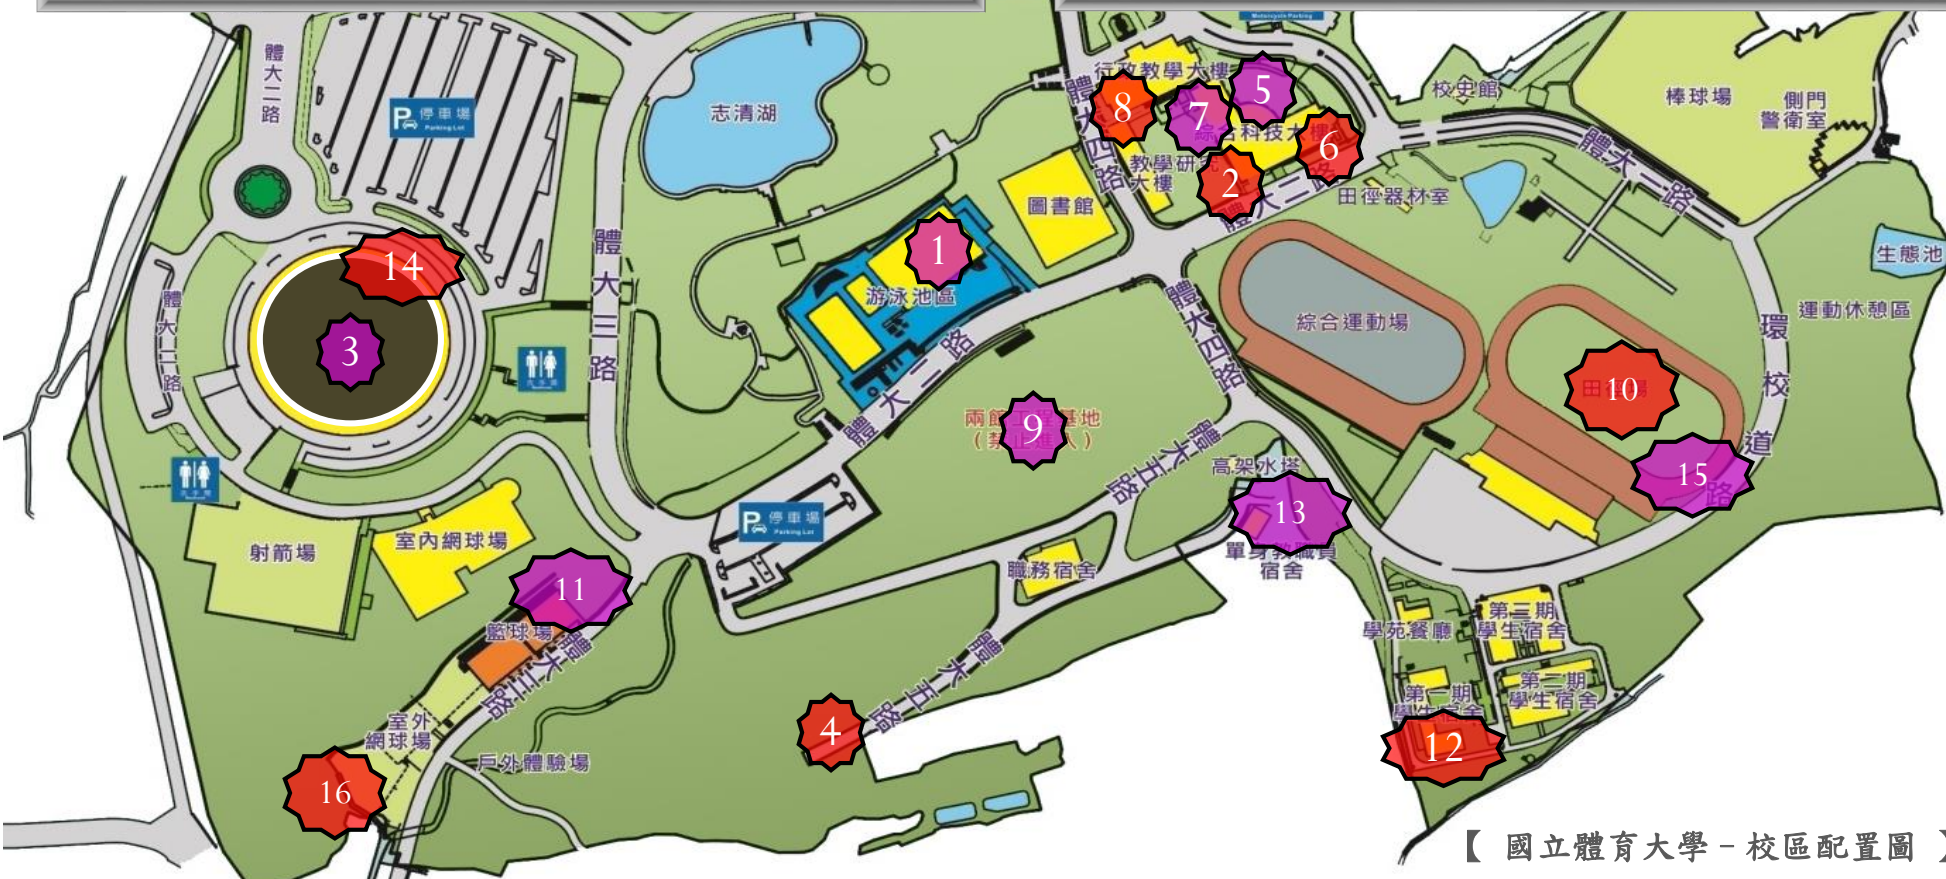

【 國立體育大學 - 校區配置圖 】

項次	工程名稱	目前進度	承辦人
1.	室內游泳池整修工程	辦理規劃設計作業	郭技士#1153
2.	百階教室整修工程	辦理規劃設計作業	陳技佐#1157
3.	體育館座椅汰換及階梯整修工程	工程施工中(110.01.12開工)	邱技正#1156
4.	國際戶外探索體育園區建置工程	修正預算書圖	邱技正#1156
5.	綜合科技大樓外牆及公共空間整修工程	工程施工中(110.01.19開工)	陳技佐#1157
6.	原住民表演舞台(國際會議廳)整修工程	辦理規劃設計作業	陳技佐#1157
7.	羽球館天花板整修工程	已完工	邱技正#1156
8.	智慧電網設置工程	規劃設計作業中	郭技士#1153
9.	中正體育園區球類館與技擊館拆除及環境整理工程	工程施工中(110.07.18開工)	邱技正#1156
10.	田徑場跑道整修工程	辦理工程招標作業中	陳技佐#1157
11.	戶外籃球場整建工程	工程發包無人投標，檢討預算書圖	邱技正#1156
12.	一期宿舍牆面防水及門窗改善工程	工程招標作業中	陳技佐#1157
13.	單身職務宿舍整修工程	工程施工中(110.06.07開工)	陳技佐#1157
14.	體育館機房上方屋頂及環形露臺防水工程	工程施工中(110.04.19開工)	邱技正#1156
15.	天然草皮足球場(田徑場)燈光照明改善工程	辦理規劃設計作業	楊技士#1158
16.	戶外網球場燈光照明改善工程	辦理規劃設計作業	楊技士#1158
