

工程名稱


- | 工程名稱 | 預定施工日期 |
|----------------------|-----------------|
| 1. 游泳池增設健身房工程 | 1091101/1110930 |
| 2. 行政大樓一樓整修工程 | 1090602/1091002 |
| 3. 戶外籃球場整建工程 | 1100101/1100831 |
| 4. 國際戶外探索體育園區建置工程 | 1091001/1100331 |
| 5. 綜合科技大樓外牆及公共空間整修工程 | 1091101/1100430 |
| 6. 棒球場整修工程 | 1081025/1090131 |

預定施工日期

工程名稱

- | 工程名稱 | 預定施工日期 |
|---------------------|-----------------|
| 7. 園區自來水(水資源)管線改善工程 | 1081111/1091231 |
| 8. 體育館機房屋頂及環形露臺防水工程 | 1091101/1100630 |
| 9. 球類館與技擊館拆除及環境整理工程 | 1100101/1100731 |
| 10. 園區運動步道改善工程 | 1090515/1090831 |
| 11. 羽球館天花板改善工程 | 1091001/1100331 |
| 12. 一期宿舍牆面防水及門窗改善工程 | 1100615/1100915 |

預定施工日期

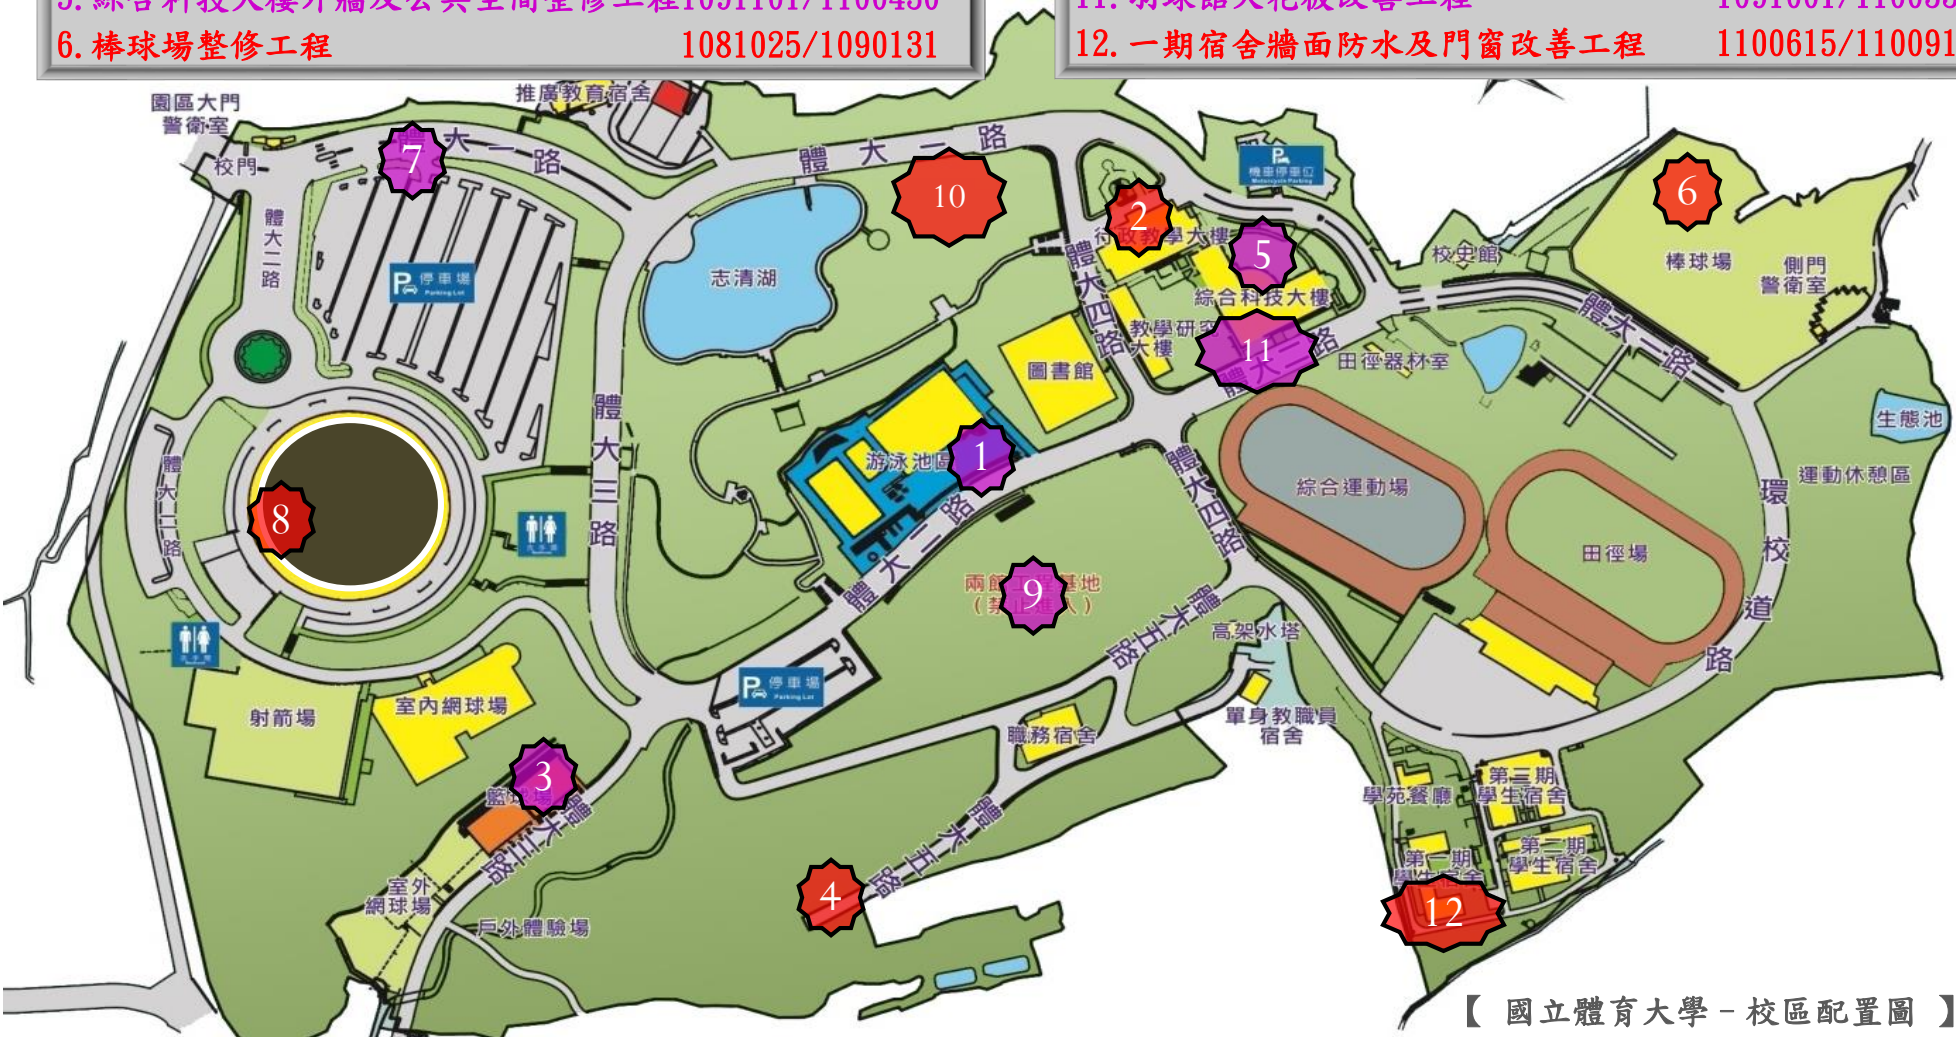

【 國立體育大學 - 校區配置圖 】

項次	工程名稱	目前進度	承辦人
1.	游泳池增設健身房工程	辦理五大管線送審作業	洪技士#1157
2.	行政大樓一樓整修工程	施工中	洪技士#1157
3.	戶外籃球場整建工程	申請建照作業	邱技正#1156
4.	國際戶外探索體育園區建置工程	設計中	邱技正#1156
5.	綜合科技大樓外牆及公共空間整修工程	設計中	洪技士#1157
6.	棒球場整修工程	已完工	洪技士#1157
7.	園區自來水(水資源)管線改善工程	變更設計中	郭技士#1153
8.	體育館機房屋頂及環形露臺防水工程	工程招標中	邱技正#1156
9.	中正體育園區球類館與技擊館拆除及環境整理工程	設計中	邱技正#1156
10.	園區運動步道改善工程	已完工	洪技士#1157
11.	羽球館天花板改善工程	設計完成，申請補助經費中	邱技正#1156
12.	一期宿舍牆面防水及門窗改善工程	設計完成，申請補助經費中	鄭技佐#1155
